
LANGLOIS SOBRETI

Métro Station République
35 - Rennes





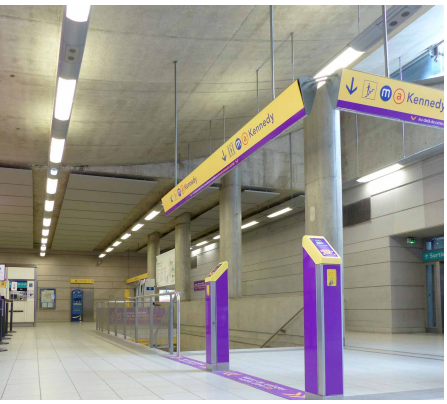

Correction acoustique de la zone « Validation des titres de transport » par la pose d'îlots absorbants en 1200 x 1200 et 2400 x 1200

Une acoustique de métro


Correction acoustique de la zone' Validation des titres de transport' par des poses d'îlots absorbants en 1200 x 1200 mm et 2400 x 1200 mm qui ont été fixés directement sur la dalle béton existante. Cette solution propose une esthétique et une acoustique haute performance. L'effet épuré et aérien de cette solution est particulièrement adapté aux espaces de réception clients. Les solutions acoustiques

Travail en milieu occupé

Afin de permettre l'usage du métro, nous avons installé des échafaudages spécifiques pour la mise en œuvre des panneaux au-dessus des escalators.

Equipes de maîtrise

- Maître d'ouvrage : **Rennes Métropole**
- Contrôleur technique : **Dekra**

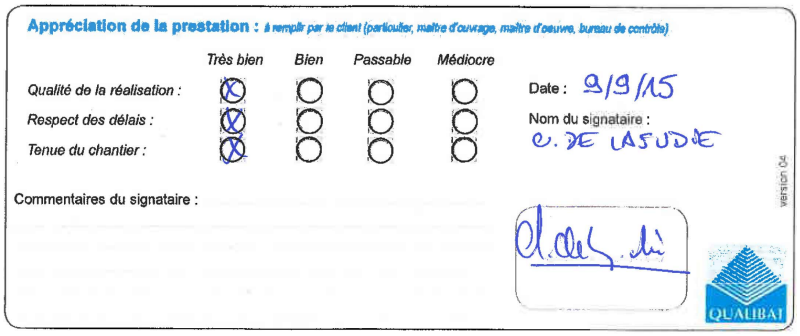
Appréciation de la prestation : *à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 9/9/15

Nom du signataire : C. DE LASUDE

Commentaires du signataire :

version 04

QUALIBAT
